

БИТКАТА ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!



КАКВО ПРАВИ ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ?





Съфинансирано от
Европейския съюз

МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ



- Процедури „За по-чист въздух!“ и „За по-чист въздух!“ (2) с общ бюджет **610 877 774,42 лв.**
- 21 АДФП на обща стойност **602 636 459,16 лв.**
- **Цел:** подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на ФПЧ10 на територията на 21 общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.
- **Основни дейности:**
 - ❖ извеждане от експлоатация и предоставяне за рециклиране на старите отоплителни устройства на твърдо гориво;
 - ❖ подмяната на старите топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи.
- Стойност на спестените емисии ФПЧ10 - 2 118,68 т/г.
- Жилищата с подменени отоплителни устройства на твърдо гориво - 76 976 бр.
- Жители, ползващи се от мерки за качеството на въздуха - 2 971 518 лица.



Съфинансирано от
Европейския съюз

МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ



Допускани грешки на етап подготовка:

- Късно провеждане на социологическото проучване;
- Късен старт на процедурите за избор на изпълнители за подготвителните дейности.

Добри практики на етап подготовка:

- Провеждане на социологическо проучване на най-ранен етап (преди обявяване на процедурата, след публикуване на одобрените от КН методика и критерии за оценка или ИГРП);
- Набиране на предварителни заявления за интерес от страна на гражданите (след публикуване на одобрените от КН методика и критерии за оценка или след обявяване на процедурата);
- Определяне на екип за подготовка на проекта на най-ранен етап;
- Разработване на проект на документация за избор на изпълнители за подготвителните дейности (след публикуване на одобрените от КН методика и критерии за оценка);
- Проучване на опита на други общини, бенефициенти по приоритет „Въздух“ на ОПОС 2014-2020 г. и ПОС 2020-2021 г.



Съфинансирано от
Европейския съюз

МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ



Допускани грешки на етап изпълнение:

- Късен старт на комуникационната кампания;
- Бавен процес/затруднения при набиране на заявления на интерес от гражданите;
- Отклонение от времевия график (забавяне на процедури, проблеми с изпълнители и др.);
- Административни и регулаторни препятствия (сложни административни процедури, промени в норматива)
- Некачествено и/или извън срок изпълнение на сключените договори по ЗОП.

Добри практики на етап изпълнение:

- Таргетирана комуникацията към целевите групи на етап подготовка, чрез собствени ПР-ресурси и канали;
- Едно гише (предоставяне на информация и консултации на гражданите и подаване на документи) и възможност за онлайн подаване на документи;
- Подробно планиране, буферни срокове и редовен мониторинг;
- Навременна комуникация с компетентните институции, планиране на резервни срокове;
- Постоянен контрол върху договорите за СМР, доставки и услуги.



Съфинансирано от
Европейския съюз

МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ВТОРИЧНОТО РАЗПРАШАВАНЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА





Съфинансирано от
Европейския съюз

МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ВТОРИЧНОТО РАЗПРАШАВАНЕ



- 5 процедури „Зелени мерки в градска среда“ с общ бюджет **104 512 522,58 лв.**
- 8 АДФП на обща стойност **32 649 541,53 лв.**
- **Цел:** Да се допринесе за подобряване на КАВ чрез намаляване наднормените нива на ФПЧ10 на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г. Фокусът е върху КАВ чрез приоритетни инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ10 и пречистването на въздуха по естествен път.
- **Основни дейности:**
 - ❖ Изграждане и/или надграждане на зелена инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда;
 - ❖ Изграждане на поливни системи.
- Зелена инфраструктура, подкрепяна за цели, различни от адаптиране към изменението на климата – хектара
- Жители, ползващи се от мерки за качеството на въздуха - 2 971 518 лица.



Съфинансирано от
Европейския съюз

МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ВТОРИЧНОТО РАЗПРАШАВАНЕ



Допускани грешки на етап подготовка:

- Късен старт на идентифицирането на терените/обектите за инвестиции;
- Късен старт на процедурите за разрешителни за изграждане на сондажи.

Добри практики на етап подготовка:

- Документално идентифициране на подходящи имоти. Обходи на място и документиране (след публикуване на ИГРП или одобренията от КН МКО);
- Детайлна проверка за собствеността (общинска);
- Обследване на възможностите за напояване и подготовка на документи за БД;
- Приоритизиране на идентифицираните имоти;
- Комуникация с местните общности и получаване на подкрепа;
- Разработване на проект на документация за избор на изпълнители за подготвителните дейности (след публикуване на одобренията от КН методика и критерии за оценка).



Съфинансирано от
Европейския съюз

МЕРКИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ТРАНСПОРТА



- Процедура „Зони с ниски емисии от транспорт“ с бюджет **15 000 000,00 лв.**
- **Бенефициенти:** Община Пловдив и Столична община
- **Цел:** Да се допринесе за подобряване на КАВ чрез намаляване на нивата на азотен диоксид и на ФПЧ10 от транспорт на територията на общини с нарушено КАВ по този показател в периода 2017-2021 г. Инвестиции за намаляване на емисиите ФПЧ от високоемисионни МПС чрез ограничаване достъпа им до най-натоварените зони в градовете. Намаляване на замърсяването на въздуха и шума и се стимулира ползването на обществения транспорт, електромобили, плъг-ин хибриди, придвижването с велосипед или пеша.
- **Основни дейности:**
 - ❖ Изграждане и/или надграждане на Зони с ниски емисии от транспорт;
 - ❖ Провеждане на информационни кампании на местно ниво.
- Изградени/надградени зони с ниски емисии от транспорт – 2 бр.
- Площ обхваната от зони с ниски емисии от транспорт – квадратни километра
- Жители, ползващи се от мерки за качеството на въздуха - лица.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!




Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Програма
"ОКОЛНА СРЕДА"
2021-2027 г.

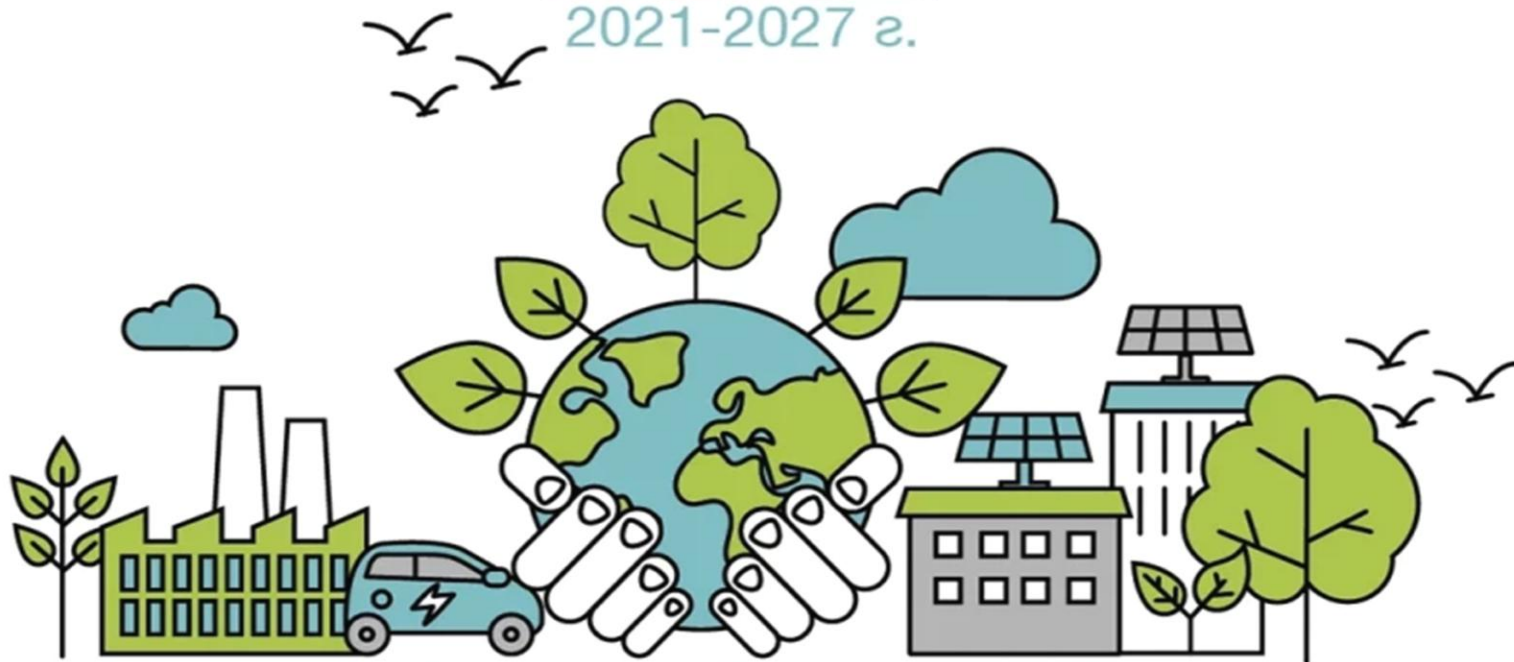

ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

<https://www.eufunds.bg/bg/opos>
